



# RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE L'ÉGLISE

Tronçon entre le chemin des Quatre-Bourgeois  
et le boulevard Hochelaga

## RENCONTRE AVEC LES COMMERÇANTS

6 AOÛT 2019

# OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

- **Faire un état de l'avancement du chantier**
- **Communiquer les résultats des inspections en santé et sécurité**
- **Informé sur les mesures complémentaires qui seront mises en place par la Ville pour favoriser l'accès aux commerces**



# 1. RAPPEL : LE CHANTIER D'AMÉNAGEMENT

Un nouveau milieu de vie structurant

## Les objectifs et principes d'aménagement :

- **Donner une identité propre à la route de l'Église**
- **Favoriser les transports actifs et collectifs**
- **Offrir un cadre vert et durable**
- **Agir comme catalyseur de développement**
  - Aménager une promenade commerciale et de nouvelles options de mobilité

# 1. RAPPEL : LE CHANTIER D'AMÉNAGEMENT

Un nouveau milieu de vie structurant

## Les objectifs et principes d'aménagement :

- **Créer un milieu où la qualité de vie domine**
- **Meilleur partage de l'espace pour tous les usagers**
  - Corridor cyclable sécurisé
  - Promenade commerciale
- **Verdissement du secteur**
  - 325 nouveaux arbres, dont 140 sur la route de l'Église
  - 7 000 m<sup>2</sup> de boisé projeté
  - 3 000 m<sup>2</sup> d'espaces végétalisés (arbustes et vivaces)



# 1 . RAPPEL : LE CHANTIER D'AMÉNAGEMENT

Expérience urbaine et paysagère globale pour les piétons et les cyclistes





## 2. AVANCEMENT DU CHANTIER : ÉCHÉANCIER

### ■ 2019

Phase 1 : Travaux préparatoires (**terminés**)

Phase 2 : Travaux côté est (**jusqu'à fin septembre**):

- asphaltage, bordures et trottoirs terminés
- accès aux commerces libérés

Phase 3 : Travaux côté ouest (**de fin septembre à fin de la saison des travaux**)



## 2. AVANCEMENT DU CHANTIER : ÉCHÉANCIER

### ■ 2020

Phase 4 :

- Trottoirs et piste cyclable côté ouest
- Travaux de finition  
(mobilier urbain, engazonnement, plantations...)
- Terminée pour les vacances de la construction (mesure complémentaire)

## 2. AVANCEMENT DU CHANTIER: ACTIONS ET ORGANISATION

- Conserver au maximum les accès aux commerces par route de l'Église
- Construction d'accès alternatifs lorsque l'accès habituel est fermé
- Présence de 5 à 8 signaleurs pour gérer la circulation automobile et la machinerie de l'entrepreneur
- Installation de panneaux d'information pour l'accès aux commerces
- Installation de panneaux d'affichage fournis par les commerçants à l'intérieur de la zone de chantier
- Communications par courriel de l'avancement des travaux
- Communication au chantier par le surveillant (cellulaires du surveillant et du responsable du chantier fournis)



### 3. APPROCHE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU CHANTIER: INSPECTIONS

- Mercredi 31 juillet (vacances de la construction)
- Lundi 5 août (reprise des activités)
- Résultats des inspections globalement très satisfaisants
- Les éléments observés répondent aux exigences du Code de sécurité des travaux de construction au moment de notre visite
- Demande d'une correction mineure uniquement :
  - Installer de la signalisation devant et au pourtour des matériaux ainsi que devant le conteneur dans une section du chantier (CSTC 3.2.1).

## 4. MESURES COMPLÉMENTAIRES: FAVORISER L'ACCÈS AUX COMMERCES

- **Ajouts de 2 signaleurs** pendant les heures commerciales hors chantier soit les soirs et les fins de semaine
- **Conscientisation** des signaleurs actuels (5 à 8) à l'**approche client** et ajout d'un signaleur au besoin
- **Amélioration de l'acheminement piéton** de la rue Noblet vers le sud par l'ajout d'un lien entre l'édifice Terrasses du Plateau et le commerce Bicycles Record
- **Bonification de la signalisation** pour piétons sur la rue Mainguy
- Installation d'un **affichage de destination en périphérie du chantier** : général et local

## 4. MESURES COMPLÉMENTAIRES: PROMOUVOIR LA RUE



**Travaux route de l'Église**

**Commerces  
OUVERTS**

**Accès alternatif par la rue Mainguy**




## 4. MESURES COMPLÉMENTAIRES: PROMOUVOIR LA RUE



### Secteur Quatre-Bourgeois / route de l'Église

- Sites confirmés
- Site conditionnel à des vérifications techniques

## 4. MESURES COMPLÉMENTAIRES: PROMOUVOIR LA RUE

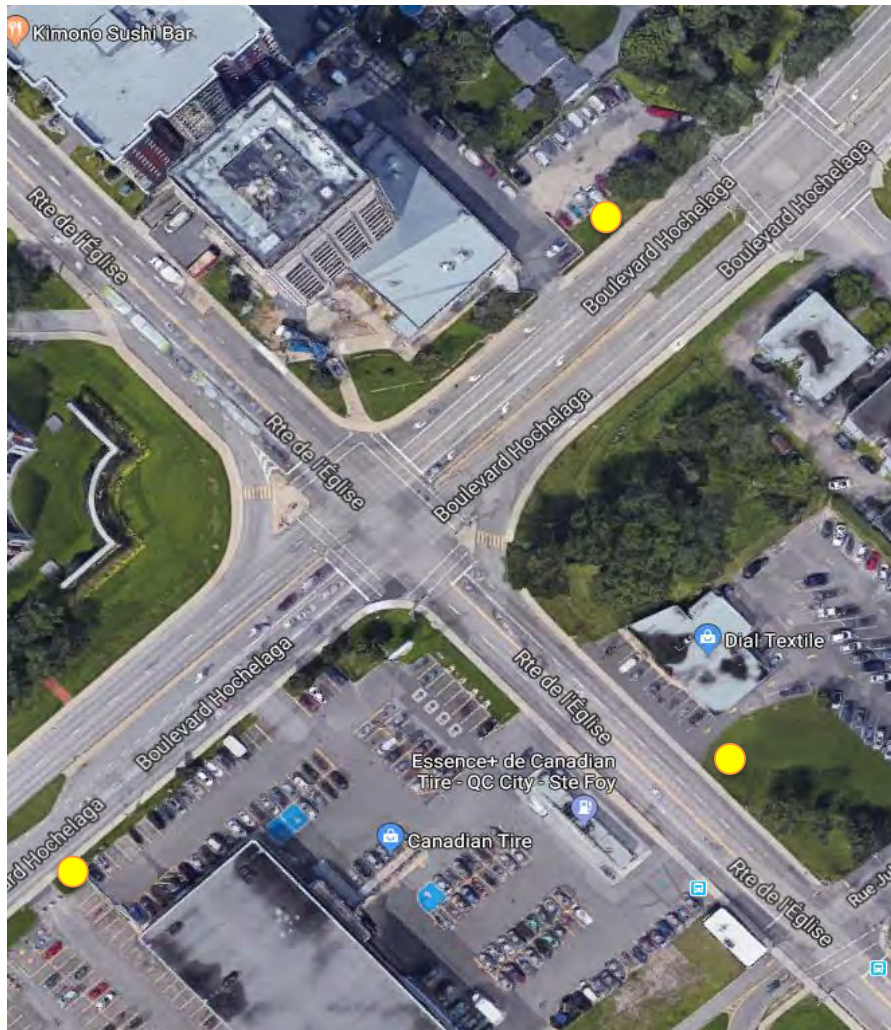

Secteur Hochelaga /  
route de l'Église

● Sites confirmés

Site supplémentaire: près  
de la rue Wolfe (important  
pour accès alternatif)

## 4. MESURES COMPLÉMENTAIRES: FIN DE CHANTIER

- Demande de la Ville à l'entrepreneur:

**Devancer la fin des travaux pour les vacances de la construction 2020 au lieu de mi-août.**





# PÉRIODE DE QUESTIONS





**MERCI**
